



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 183 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, **17 MAYO 2019**

VISTOS: La Carta N° 002- 2019/CONSORCIO FORTALEZA, con DTI N° 01840 de fecha 20 de marzo de 2019, la Carta N° 164-2019/GRP-401000-401400-401420 de fecha 28 de marzo de 2019, la Carta N° 005-2019/ING.SCES/CCER/RL con Expediente N° 02348 de fecha 15 de abril de 2019, el Informe N° 337-2019/GRP-401000-401400-401420 de fecha 30 de abril de 2019, el Informe N° 0015-2019/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 07 de mayo de 2019 y el Informe N° 0016-2019/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 13 de mayo de 2019, relacionados con la Liquidación del Contrato de la obra: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD I-1 EN LA PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA";

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 28 de marzo de 2018, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el contratista CONSORCIO FORTALEZA, el Contrato N° 006-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, para la ejecución de la obra: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD I-1 EN LA PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA", con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario y un monto contractual ascendente a CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 40/100 SOLES (S/ 4'304,677.40), incluido IGV, materia de la Licitación Pública N° 004-2017/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G – PRIMERA CONVOCATORIA, la misma que se encuentra desagregada en los siguientes ítems:

- ITEM 01: "Instalación de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad I-1 en la localidad de Hualcuy, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura", Código SNIP N° 271501.
- ITEM 02: "Instalación de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad I-1 en la localidad de El Huilco, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura", Código SNIP N° 248913.
- ITEM 03: "Instalación de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad I-1 en la localidad de Joras, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura", Código SNIP N° 215907.
- ITEM 04: "Mejoramiento de los servicios de Salud del Puesto de salud I-1 El Toldo en el Sector El Toldo, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura", Código SNIP N° 252187.

Que, con fecha 15 de febrero de 2019, se suscribió el Acta de Recepción de la obra: "ITEM 01: "Instalación de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad I-1 en la localidad de Hualcuy, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura", Código SNIP N° 271501.

Que, con fecha 15 de febrero de 2019, se suscribió el Acta de Recepción de la obra: ITEM 02: "Instalación de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad I-1 en la localidad de El Huilco, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura", Código SNIP N° 248913.



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 183 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, **17 MAYO 2019**

Que, con fecha 15 de febrero de 2019, se suscribió el Acta de Recepción de la obra: ITEM 03: "Instalación de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad I-1 en la localidad de Joras, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura", Código SNIP N° 215907.

Que, con fecha 15 de febrero de 2019, se suscribió el Acta de Recepción de la obra: ITEM 04: "Mejoramiento de los servicios de Salud del Puesto de salud I-1 El Toldo en el Sector El Toldo, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura", Código SNIP N° 252187.

Que, mediante Carta N° 002-2019/CONSORCIO FORTALEZA, con DTI N° 01840 de fecha 20 de marzo de 2019, el contratista CONSORCIO FORTALEZA, ejecutor de la obra: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD I-1 EN LA PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA", presentó a la Entidad la liquidación del contrato de la obra en referencia, para su revisión y trámite respectivo;

Que, la División de Obras, ha efectuado la revisión de la liquidación presentada por la empresa contratista CONSORCIO FORTALEZA, encontrándola no conforme según la CARTA N° 005-2019/ING.SCES/CCER/RL con Expediente N° 02348 de fecha 15 de abril de 2019, emitida por el Representante Común del Consorcio Supervisor Ayabaca y el informe N° 0016-2019/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 13 de mayo de 2019, emitido por el Ing. Luis Alberto Salazar Cabrera, por las consideraciones expuestas en los citados documentos, por lo que en concordancia con el Artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley 30225, aprobado por D.S. N° 350-2015-EF, se ha procedido a elaborar otra liquidación; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,

Que, el Sistema de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determina el siguiente detalle:

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1 AUTORIZADO

- Contrato Principal	
Sector Hualcuy	885,751.79
Sector Huilco	903,956.96
Sector Joras	1,006,728.87
Sector Toldo	851,594.07
- Adicional	85,279.58
- Deductivo	- 31,928.40
- Reajuste Sector Hualcuy	30,095.24



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 183 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, **17 MAYO 2019**

Sector Huilco	24,521.52
Sector Joras	26,942.28
Sector El Toldo	<u>14,714.90</u>

TOTAL ==> S/ **3,797,656.81**

1.2 PAGADO

- Contrato Principal	3,616,099.58
- Adicional	<u>85,279.59</u>

TOTAL ==> S/ **3,701,379.17**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ **96,277.64**

II. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

2.1 AUTORIZADO

- Contrato Principal	
Sector Hualcuy	159,435.32
Sector Huilco	162,712.25
Sector Joras	181,211.20
Sector Toldo	153,286.93
- Adicional	15,350.32
- Deductivo	- 5,747.11
- Reajuste	
Sector Hualcuy	5,417.14
Sector Huilco	4,413.87
Sector Joras	4,849.61
Sector El Toldo	2,648.68

TOTAL AUTORIZADO S/ **683,578.21**

2.2 PAGADO

- Contrato Principal.	650,897.91
- Adicional	15,350.32
TOTAL PAGADO	666,248.23



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 183 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, **17 MAYO 2019**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 17,329.98

III. OTROS

- 3.1 PENALIDAD POR INASISTENCIA DE PERSONAL – EL HUILCO**
- Calculado 51,200.16
 - Descontado 51,200.16
- 3.2 PENALIDAD POR INASISTENCIA DE PERSONAL – EL TOLDO**
- Calculado 3,116.74
 - Descontado 3,116.74

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA S/ 0.00

RESUMEN

1. Contrato Vigente S/IGV 96,277.64
2. Impuesto General a las Ventas 17,329.98

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 113,607.62

Que, existe un saldo a devolver al contratista por los conceptos de liquidación contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

- 1.00 AUTORIZADO Y PAGADO 96,277.64
- 2.00 I.G.V 17,329.98

SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA 113,607.62

Con la visación de la División de Obras, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas a este Despacho mediante Resolución Ejecutiva Regional N°



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 183 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, **17 MAYO 2019**

100-2012/GRP-PR de fecha 16 de febrero de 2012, que aprueba la actualización de la Directiva N° 010-2006/GRP-GRPPAT-GSDI: Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de las dependencias del Gobierno Regional de Piura, Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y normas modificatorias y la Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 01 de enero de 2019;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato de la obra: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD I-1 EN LA PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA", **ITEM 01:** "Instalación de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad I-1 en la localidad de Hualcuy, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura", Código SNIP N° 271501; **ITEM 02:** "Instalación de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad I-1 en la localidad de El Huilco, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura", Código SNIP N° 248913; **ITEM 03:** "Instalación de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad I-1 en la localidad de Joras, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura", Código SNIP N° 215907; **ITEM 04:** "Mejoramiento de los servicios de Salud del Puesto de salud I-1 El Toldo en el Sector El Toldo, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura", Código SNIP N° 252187, ejecutadas bajo la modalidad de contrata por el contratista CONSORCIO FORTALEZA, durante el ejercicio presupuestal del año 2018, cuyo valor asciende a CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 01/100 SOLES (S/ 4,481,235.01) y para efectos contables se alcanza Anexo en cuatro folios, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- La Liquidación Contractual a favor del Contratista CONSORCIO FORTALEZA, es de CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 62/100 SOLES (S/ 113,607.62). Su cancelación está supeditada a la presentación del Certificado de No Adeudos a SENCICO.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

ARTICULO CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Obras, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y al contratista CONSORCIO FORTALEZA, ejecutor de la obra (domicilio: Urbanización Los Geranios Mz. "F" Lote 16 – Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"
Ing. Fernando Rujdías Ojeda
GERENTE SUB REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **183** -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, **17 MAYO 2019**

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

Pliego 457 : Gobierno Regional Piura
 Unidad Ejecutora 002 : Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
 Obra : "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD I-1 EN LA PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA":

ITEM 01: "Instalación de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad I-1 en la localidad de **Hualcuy**, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura".

ITEM 02: "Instalación de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad I-1 en la localidad de **El Huilco**, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura.

ITEM 03: "Instalación de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Complejidad I-1 en la localidad de **Joras**, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura".

ITEM 04: "Mejoramiento de los servicios de Salud del Puesto de salud I-1 El Toldo en el Sector **El Toldo**, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca – Piura".

Proceso de Selección

Entidad contratante

Contrato

Contratista

Supervisor de la obra

Fuente de Financiamiento

Presupuesto Contratado

Plazo ejecución

Ampliación de plazo

Entrega de Terreno

Fecha Término plazo contractual

Fecha de Recepción del servicio

Licitación Pública N° 004-2017/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G – Primera Convocatoria.

Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.

N° 006-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

CONSORCIO FORTALEZA.

CONSORCIO SUPERVISOR AYABACA.

Recursos Ordinarios.

S/. 4, 304,677.40 Incl. IGV.

120 días calendario.

87 días calendario

19 abril 2018.

14 diciembre 2018

15 febrero 2019.

ANEXO

OBRA: ITEM 01 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD TIPO I-I EN LA LOCALIDAD DE HUALCUI - DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA.

PPTO. CONTRATADO
CONTRATO SIN IGV

SI. 1,045,187.11
SI. 885,751.79

CONTRATISTA: CONSORCIO FORTALEZA (EMPTRESA CONSTRUCTORA YERMI CONTRATISTAS GENERALES EIRL Y D&V INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SRL)

PLAZO EJECUCION
120 DIAS CALENDARIO

Nº VALORIZACION.	FECHA APROB.	DETALLE	MONTO	MONTO LIQUIDO RECIBIDO										TOTAL PAGADO
				EFFECTIVO	C.P	FECHA	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.		C.P	FECHA				
							AUT.	PAGADO						
ADELANTO DIRECTO				0.00			0.00		0			0.00		
ADELANTO MATERIALES				0.00			0.00		0		0	0.00		
				0.00			0.00					0.00		
001	May.18	15,069.26	15,069.26	15,069.26	SI/AF 0585 CP/ 263-264	12/06/2018	2,712.47	2,712.47	SI/AF 0585 CP/ 263-264	12/06/2018		17,781.73		
002	Jun.18	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	00/01/1900		0.00		
003	Jul.18	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	00/01/1900		0.00		
004	Ago.18	182,699.77	182,699.77	182,699.77	SI/AF 0585 CP/ 631	12/09/2018	32,885.96	32,885.96	SI/AF 0585 CP/ 631	12/09/2018		215,585.73		
005	Sep.18	181,595.59	181,595.59	181,595.59	SI/AF 0585 CP/ 748	23/10/2018	32,687.21	32,687.21	SI/AF 0585 CP/ 748	23/10/2018		214,282.80		
006	Oct.18	36,167.65	36,167.65	36,167.65	SI/AF 0585 CP/ 263-264		6,510.18	6,510.18	SI/AF 0585 CP/ 263-264	00/01/1900		42,677.83		
007	Nov.18	172,200.51	172,200.51	172,200.51	SI/AF 0585 CP/ 263-264		30,996.09	30,996.09	SI/AF 0585 CP/ 263-264	00/01/1900		203,196.60		
008	Dic.18	287,569.36	287,569.36	287,569.36	SI/AF 0585 CP/ 263-264		51,762.49	51,762.49	SI/AF 0585 CP/ 263-264	00/01/1900		339,331.85		
SUB TOTAL 1				875,302.14										
ADICIONAL														
Val. 01 Adic.01				32,836.08	SI/AF 0694 CP/ 125-126-834	06/12/2018	5,910.49	5,910.49	SI/AF 0694 CP/ 125-126-834	06/12/2018		38,746.57		
SUB TOTAL 2				32,836.08										
IGV				908,138.22								1,077,603.11		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA														
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA - IGV.														
COSTO TOTAL DE LA OBRA				SI. 1,107,116.57										

CONTRATO PRINCIPAL

SI. 885,751.79

SI. 32,836.08

(SI. 10,448.72)

SI. 30,095.24

SI. 938,234.39

SI. 159,435.32

SI. 5,910.49

(SI. 1,880.77)

SI. 5,417.14

SI. 1,107,116.57

SI. 1,107,116.57

TOTAL PAGADO

TOTAL IGV

COSTO PARCIAL

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA - IGV.

ADELANTO DIRECTO

ADELANTO MATERIALES



COSTO TOTAL DE OBRA

SI. 1,107,116.57

SI. 1,107,116.57

SI. 1,107,116.57

SI. 1,107,116.57

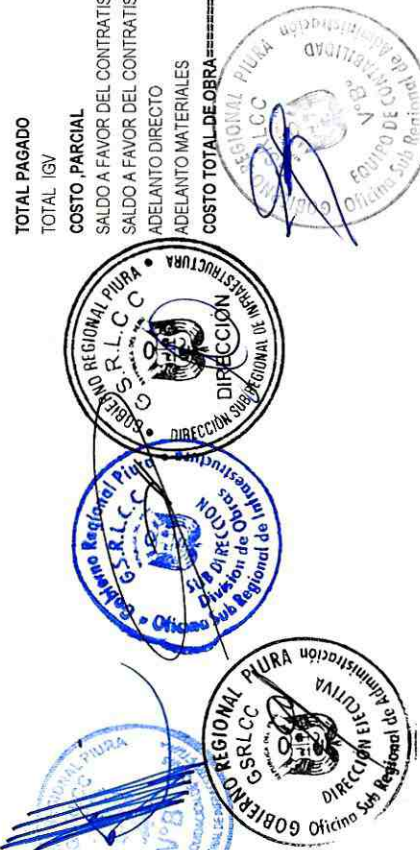

ANEXO

OBRA: ITEM 04 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 EL TOLDO EN EL SECTOR EL TOLDO, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA.

CONTRATISTA: CONSORCIO FORTALEZA (EMPRESA CONSTRUCTORA YERMI CONTRATISTAS GENERALES EIRL Y DAV INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SRL)

PPTO. CONTRATADO
CONTRATO SIN IGV

S/. 1,004,881.01
S/. 851,594.08

120 DIAS CALENDARIO

120 DIAS CALENDARIO											
MONTO LIQUIDO RECIBIDO				IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.				TOTAL PAGADO			
FECHA		DETALLE		MONTO		EFFECTIVO		C.P		FECHA	

CONTRATO PRINCIPAL

Adicional de obra 01 S/. 851,594.07

Deductivo obra 01 S/. 15,152.88

REAJUSTES (S/. 7,159.90)

S/. 14,714.90

COSTO PARCIAL S/. 874,301.95

IGV CONTRATO S/. 153,286.93

Adicional de obra 01 S/. 2,727.52

Deductivo de obra 01 (S/. 1,288.78)

IGV REAJUSTES S/. 2,648.68

COSTO TOTAL DE OBRA S/. 1,031,676.30

TOTAL PAGADO

TOTAL IGV

COSTO PARCIAL

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA - IGV

ADICIONAL MATERIALS C.C

COSTO TOTAL DE OBRA

S/. 859,586.45

154,725.56

1,014,312.01

14,715.50

2,648.79

0.00

0.00

S/. 1,031,676.30



ANEXO

OBRA: ITEM 03 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD TIPO I-1 EN LA LOCALIDAD DE JORAS - DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA.

PPTO. CONTRATADO
CONTRATO SIN IGV

S/. 1,187,940.07
S/. 1,006,728.87

CONTRATISTA: CONSORCIO FORTALEZA (EMPRESA CONSTRUCTORA VERMIH CONTRATISTAS GENERALES EIRL Y D&V INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SRL)

PLAZO EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

120 DIAS CALENDARIO												
FECHA			DETALLE		MONTO		MONTO LIQUIDO RECIBIDO					
N° VALORIZACION.	FECHA APROB.	FECHA	MONTO VALORIZ.	REA- JUSTES	VALORIZ. BRUTA	AMORTIZACION		VALORIZ. NETA	IMPORTE A PAGAR	EFFECTIVO	C.P	FECHA
						ADEL. DIRECTO.	ADEL. MATER.					
			ADELANTO DIRECTO		S/. 0.00					0.00		
			ADELANTO MATERIALES		0.00					0.00		
										0.00		

CONTRATO PRINCIPAL

S/. 1,006,728.87

Adicional de obra 01

S/. 18,645.31

Deductivo obra 01

(S/. 7,159.90)

REAJUSTES

S/. 26,943.78

COSTO PARCIAL

S/. 1,045,156.56

IGV CONTRATO

S/. 181,211.20

Adicional de obra 01

S/. 3,356.16

Deductivo de obra 01

(S/. 1,288.78)

IGV. REAJUSTES

S/. 4,849.90

COSTO TOTAL DE OBRA

S/. 1,233,284.75

TOTAL PAGADO

TOTAL IGV

S/. 1,018,212.78

183,278.29

1,201,491.07


26,943.78

4,849.90

0.00

0.00

S/. 1,233,284.75



ANEXO

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD TIPO I-1 EN LA LOCALIDAD DE HUILCO - DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA.

S/. 1,066,669.21
S/. 903,956.96

120 DIAS CALENDARIO

120 DIAS CALENDARIO

CONTRATO PRINCIPAL	
Adicional de obra 01	S/ 18.645,31
Deductivo obra 01	(S/ 7,159.90)
REALUSTES	S/ 24.521,52
COSTO PARCIAL	S/ 939.963,89
I.G.V. CONTRATO	S/ 162.712,25
Adicional de obra 01	S/ 3.356,16
Deductivo de obra 01	(S/ 1,288,78)
I.G.V. REALUSTES	S/ 4.413,87
COSTO TOTAL DE OBRA	S/ 1,109.157,39

Adicional de obra 01	S/ 18,645.31
Deductivo obra 01	(S/ 7,159.90)
REALIUSTES	S/ 24,521.52
COSTO PARCIAL	S/ 939,963.89
I.G.V. CONTRATO	S/ 162,712.25
Adicional de obra 01	S/ 3,356.16
Deductivo de obra 01	(S/ 1,288.78)
I.G.V. REALIUSTES	S/ 4,413.87
COSTO TOTAL DE OBRA	S/ 1,109,157.39

TOTAL IGV

COSTO PARCIAL

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA - IGV.

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA - IGV.

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA - IGV.

ADELANTO DIRECTO

ADELANTO MATERIALES

CC

8

100

[illegible]
